Aufgaben zur Steuerung des Projekts

Aufgabe 1
Welche Maßnahmen schlagen Sie am 30.08. vor, um die Veranstaltung im Projekt „Event Veranstaltung“ noch zu retten? Wie kann die ursprüngliche Durchlaufzeit vom 01.07. bis zum 06.09. wieder erreicht werden? Oder kann bei anderen Aufgaben wie eingegriffen werden?

Max L. J. Wolf
Dipl. Volkswirt

Buchenstraße 4 A
85716 Unterschleißheim
Tel. 089 / 3107992
Fax 089 / 3104852
E-Mail max.wolf@wolf-pmt.de

Alle Rechte liegen beim Herausgeber und Autor. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Praktische Tipps zu Ihrer Projektarbeit

Nr.	PSP Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	0	**Event Veranstaltung**	**238,5 Tage**	**Mi 01.06.16**	**Fr 28.04.17**
2	MST 1	MST 1:Projektstart erfolgt	0 Tage	Mi 01.06.16	Mi 01.06.16
3	2	**Abschnitt Kick off**	**1 Tag**	**Mi 01.06.16**	**Mi 01.06.16**
5	MST 2	MST 2: Kick off fertig	0 Tage	Mi 01.06.16	Mi 01.06.16
6	3	**Abschnitt Vertrag unterzeichnet**	**21 Tage**	**Do 02.06.16**	**Do 30.06.16**
13	MST 3-70	MST 3: Vertrag unterzeichnet	0 Tage	Do 30.06.16	Do 30.06.16
14	4	**Abschnitt Konzept**	**87 Tage**	**Do 02.06.16**	**Fr 30.09.16**
22	MST 4	MST 4: Konzeptfreigabe	0 Tage	Fr 30.09.16	Fr 30.09.16
23	5	**Abschnitt Beschaffung**	**122 Tage**	**Do 16.06.16**	**Fr 02.12.16**
37	MST 5	MST 5: Beschaffung erledigt	0 Tage	Fr 02.12.16	Fr 02.12.16
38	6	**Abschnitt Redaktionsschluss**	**73 Tage**	**Mi 21.09.16**	**Fr 30.12.16**
45	MST 6	MST 6: Redaktionsschluss	0 Tage	Fr 30.12.16	Fr 30.12.16
46	7	**Beginn Veranstaltung**	**196 Tage**	**Do 23.06.16**	**Do 23.03.17**
62	MST 7	MST 7: Beginn Veranstaltung	0 Tage	Do 23.03.17	Do 23.03.17
63	8	**Abschnitt Ende Veranstaltung**	**1,5 Tage**	**Fr 24.03.17**	**Sa 25.03.17**
75	MST 8	MST 8: Veranstaltung beendet	0 Tage	Sa 25.03.17	Sa 25.03.17
76	9	**Abschnitt Projektabschluss**	**25 Tage**	**Sa 25.03.17**	**Fr 28.04.17**
82	MST 9	MST 9: Projektabschluss	0 Tage	Fr 28.04.17	Fr 28.04.17

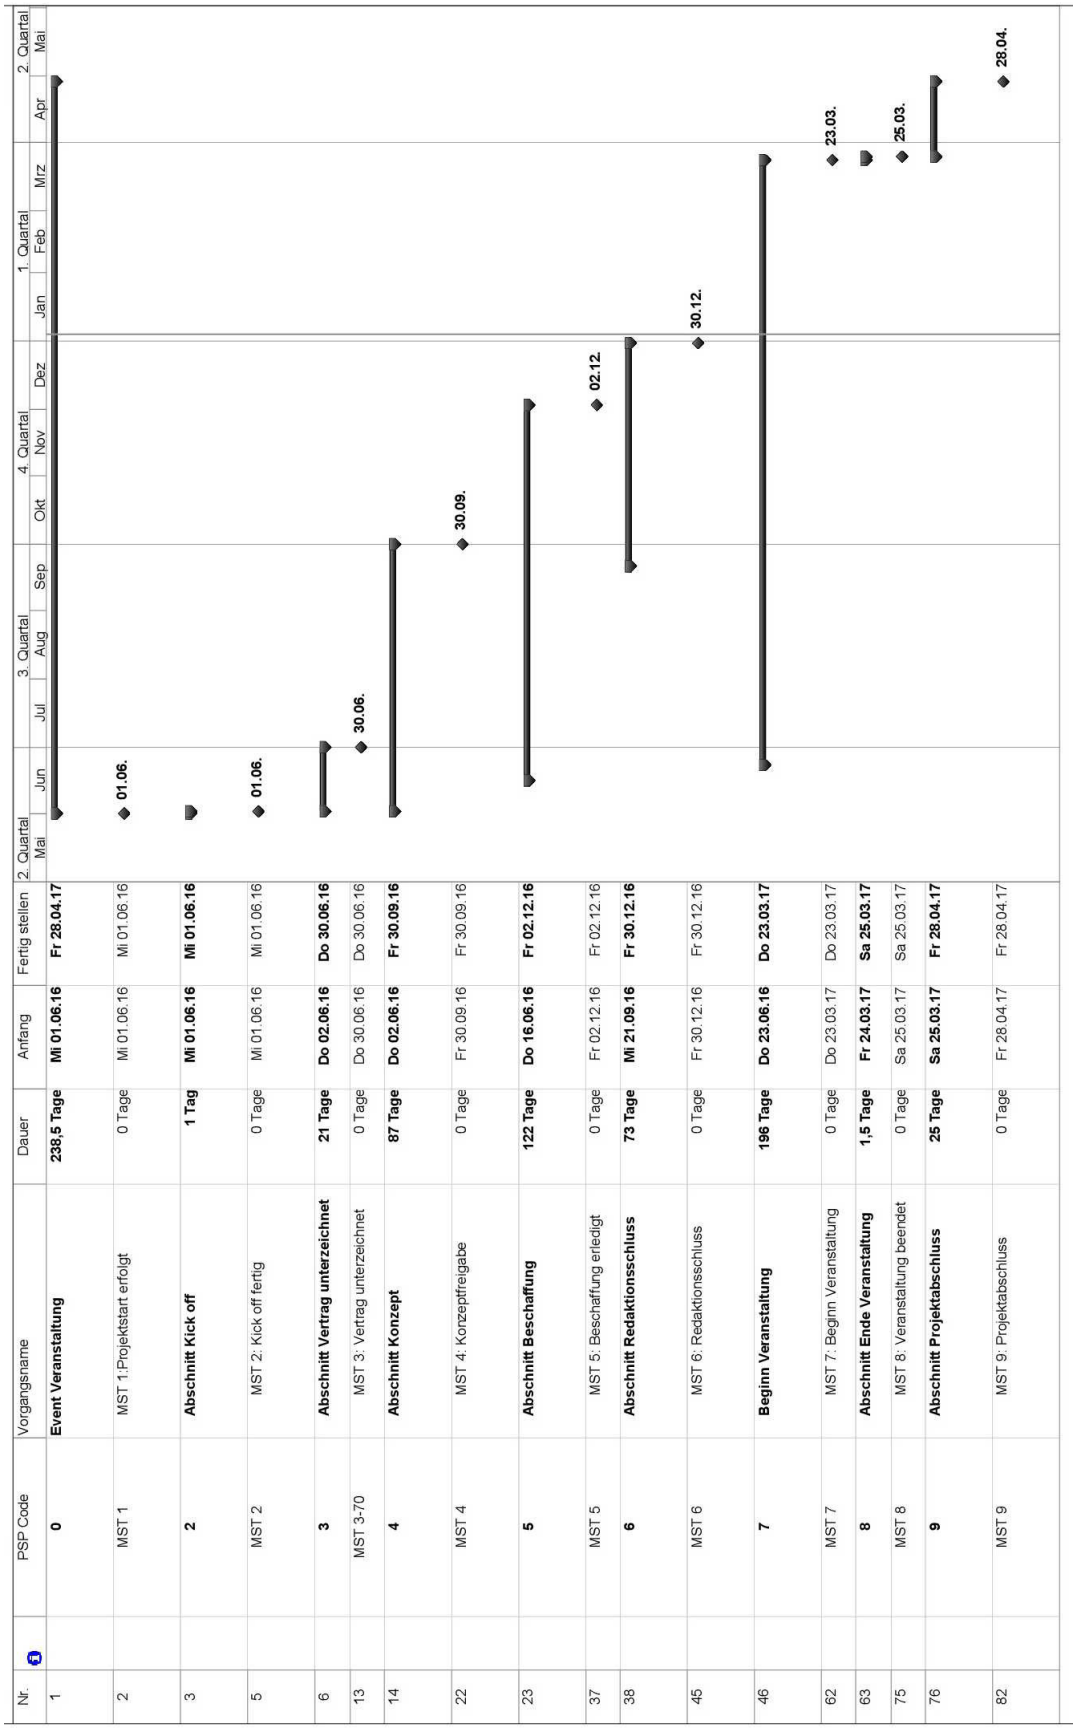

Terminplan „Event Veranstaltung“

Alle Rechte liegen beim Herausgeber und Autor. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Praktische Tipps zu Ihrer Projektarbeit

Aufgabe 2
Richten Sie bitte für das Projekt „Event Veranstaltung“ eine Meilenstein-Trendanalyse ein. Hier die Meilensteine mit den Terminen:

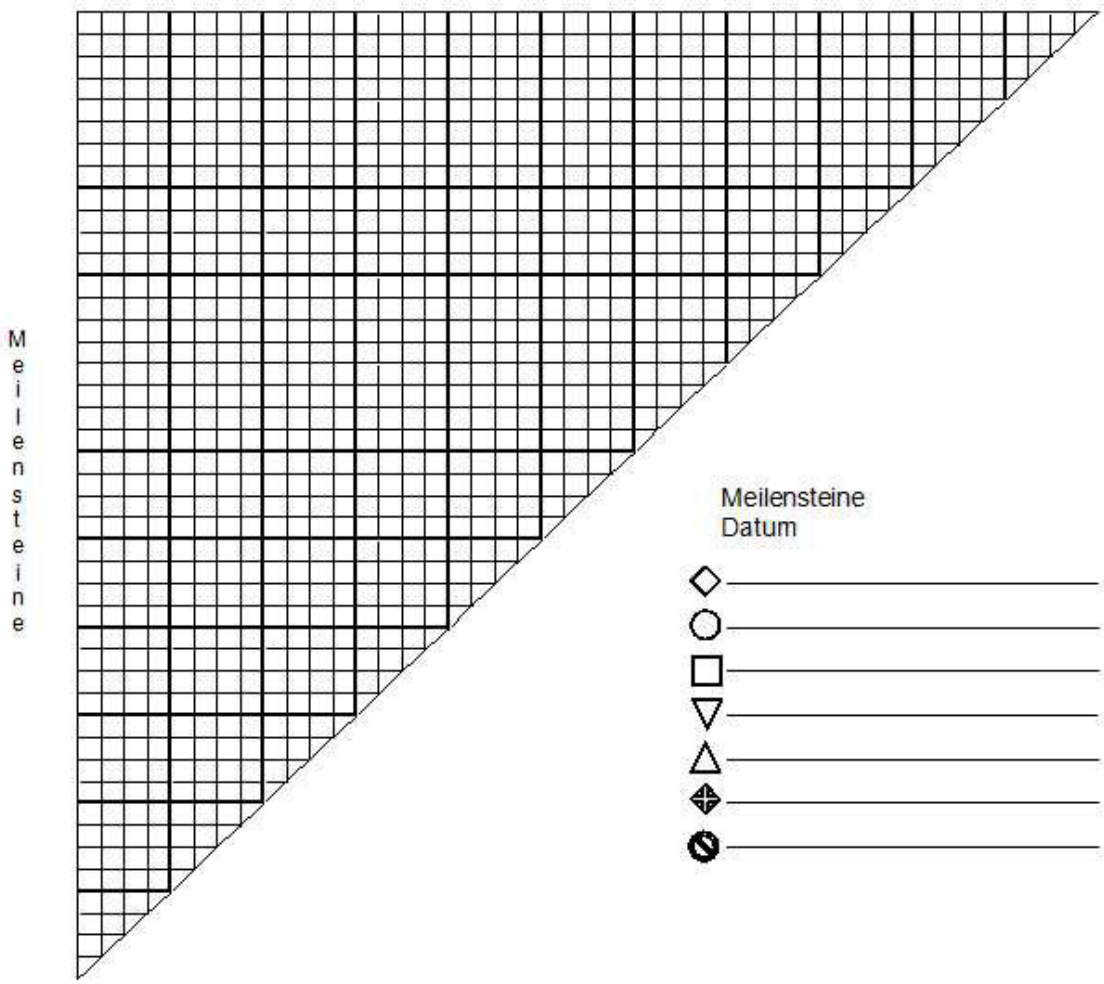

Alle Rechte liegen beim Herausgeber und Autor. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Praktische Tipps zu Ihrer Projektarbeit

Aufgabe 3
Tragen Sie nun bitte zum Berichtszeitpunkt 30.08. beim Projekt „Event Veranstaltung“ die Prognose nach dem neuen Meilensteinplan ein.

Nr.	PSP Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	0	**Event Veranstaltung**	**276,5 Tage**	**Mi 01.06.16**	**Mi 21.06.17**
2	MST 1	MST 1:Projektstart erfolgt	0 Tage	Mi 01.06.16	Mi 01.06.16
3	2	**Abschnitt Kick off**	**1 Tag**	**Mi 01.06.16**	**Mi 01.06.16**
5	MST 2	MST 2: Kick off fertig	0 Tage	Mi 01.06.16	Mi 01.06.16
6	3	**Abschnitt Vertrag unterzeichnet**	**21 Tage**	**Do 02.06.16**	**Do 30.06.16**
13	MST 3-70	MST 3: Vertrag unterzeichnet	0 Tage	Do 30.06.16	Do 30.06.16
14	4	**Abschnitt Konzept**	**125 Tage**	**Do 02.06.16**	**Mi 23.11.16**
22	MST 4	MST 4: Konzeptfreigabe	0 Tage	Mi 23.11.16	Mi 23.11.16
23	5	**Abschnitt Beschaffung**	**160 Tage**	**Do 16.06.16**	**Mi 25.01.17**
37	MST 5	MST 5: Beschaffung erledigt	0 Tage	Mi 25.01.17	Mi 25.01.17
38	6	**Abschnitt Redaktionsschluss**	**73 Tage**	**Mo 14.11.16**	**Mi 22.02.17**
45	MST 6	MST 6: Redaktionsschluss	0 Tage	Mi 22.02.17	Mi 22.02.17
46	7	**Beginn Veranstaltung**	**234 Tage**	**Do 23.06.16**	**Mo 15.05.17**
62	MST 7	MST 7: Beginn Veranstaltung	0 Tage	Mo 15.05.17	Mo 15.05.17
63	8	**Abschnitt Ende Veranstaltung**	**39,5 Tage**	**Fr 24.03.17**	**Mi 17.05.17**
75	MST 8	MST 8: Veranstaltung beendet	0 Tage	Mi 17.05.17	Mi 17.05.17
76	9	**Abschnitt Projektabschluss**	**25 Tage**	**Mi 17.05.17**	**Mi 21.06.17**
82	MST 9	MST 9: Projektabschluss	0 Tage	Mi 21.06.17	Mi 21.06.17

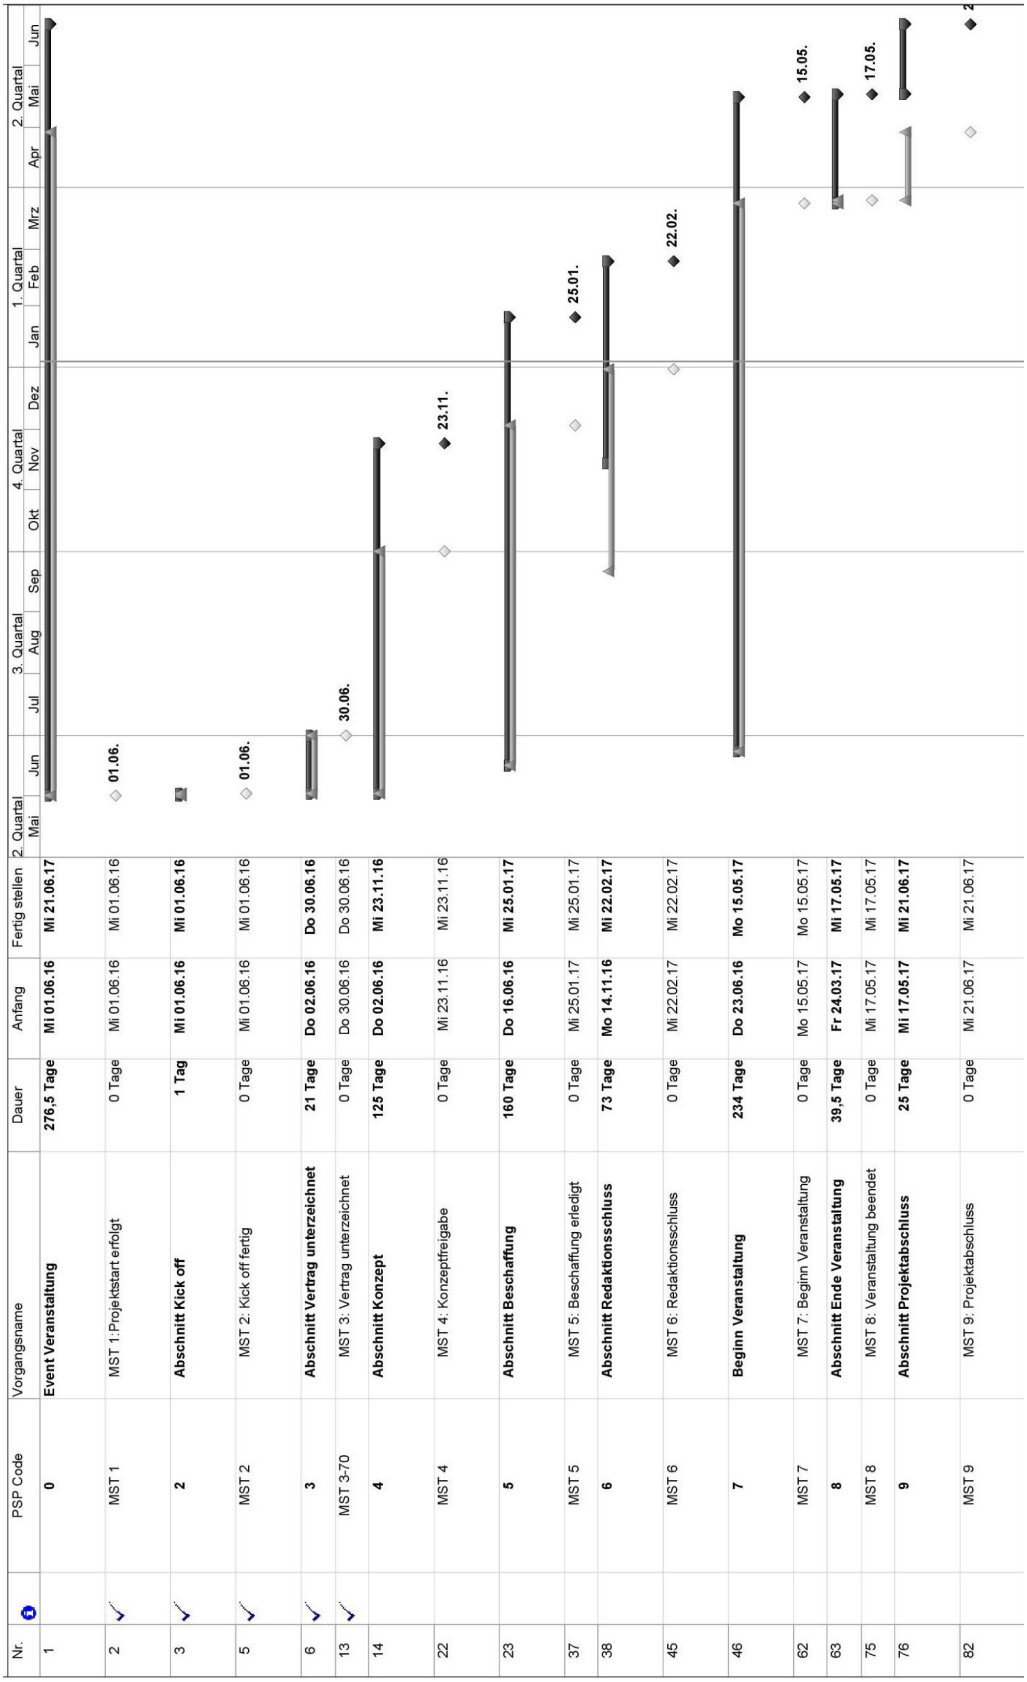

Alle Rechte liegen beim Herausgeber und Autor. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Praktische Tipps zu Ihrer Projektarbeit

Aufgabe 4
Erstellen Sie bitte für das Projekt „Event Veranstaltung“ zum 30.08.einen Statusbericht, soweit Ihnen die entsprechenden Daten vorliegen.

Stand:	Momentane Situation	rot ◯ gelb ◯ grün ◯

Wesentliche neue Aspekte gegenüber dem letzten Bericht:

Kritische Punkte:	Konsequenzen/Risiken:	KTA

Projekt-fortschritt:	SOLL:	IST:	Abweichung:	MTA

Eingeleitete Maßnahmen:

Aufgabe 5
Zählen Sie bitte 5 Änderungen auf, die im Laufe eines Event-Projekts auftreten können.

Aufgabe 6
Zählen Sie bitte 5 Claims, die im Laufe eines Event-Projekts auftreten können.

Alle Rechte liegen beim Herausgeber und Autor. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.
